POHJAVESIEN MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI

PBM Geotekniikka
Innokaari 12, 96930 Rovaniemi
Y-tunnus 3413889-2
etunimi.sukunimi@pbm.fi

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy
240567
Rättivaara
Enijärventie

Projekti/kohde:	**240567_Rättivaara**		
Asennus pvm:	**11.9.2024**		
Putken numero:	**PVP1**		
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:	ETRS-GK27	N2000	
KOORDINAATIT: X:	**7410623,726**		
Y:	**27489916,112**		
Z:	**+224,91**		
TASOTIEDOT JA RAKENNE			
Putken kokonaispituus:	6,80 m		
Putki maanpinnasta:	1,01 m		
Jatkoputken pituus:	3,80 m		
Siivilän pituus:	3,00 m		
Siivilän rako, (mm)	0,3 mm		
Putken yläpään taso:	+225,91		
Siivilän alapään taso:	+219,11		
Putki materiaali	HDPE		
Putken koko, (mm)	60/52		
Vandaaliputken materiaali:	TERÄS		
Putki lukollinen:	Ei		
Asennustiedot:			
Putken kuva/sijainti	**Syvyys (m)**	**Maalaji**	
	0-2,9	**HkMr**	
	2,9-5,8	**Ka?**	

HAVAINNOT

Pvm	Vesipinta putken päästä	Pohjavesipinnan taso	Huom.
11.9.2024	-	-	
16.9.2024	5,72	220,19	
Wmax =		220,19	Δh
Wmin =		220,19	0,00

Huomautukset:

11.9.2024 Putki asennettu mahdolliseen kallioon, ei varmistettu
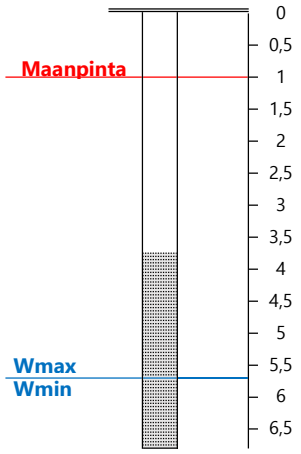
11.9.2024 Putki kuiva
